



PHỤ LỤC 01:
MỘT SỐ BẢNG BIỂU

Bảng 01: Tổng ngân sách giai đoạn 2021-2025

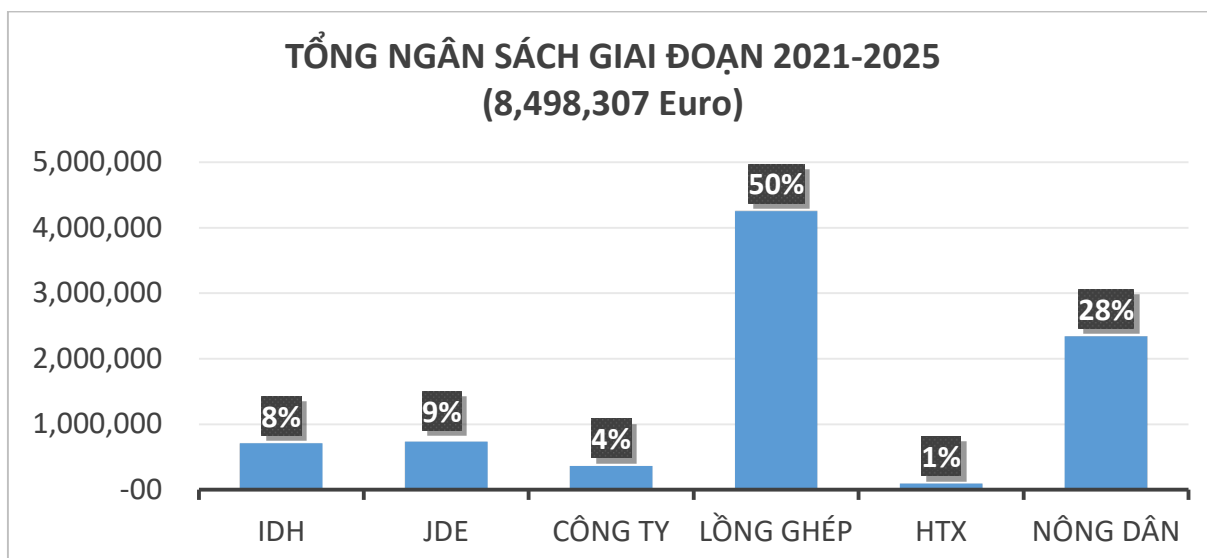


Bảng 02: Tổng ngân sách năm 2022

Ngân sách năm 2022 (2.581.833 Euro)

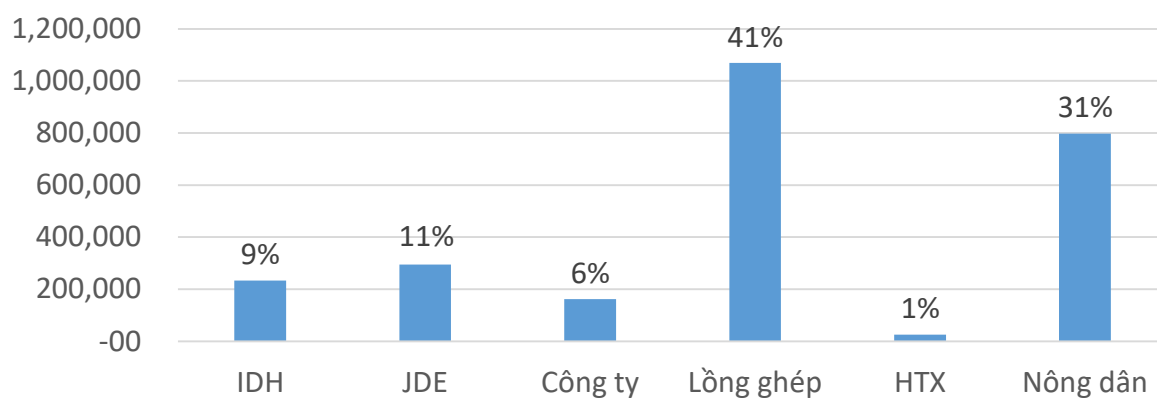

Bảng 03: Giải ngân năm 2022 Giải ngân theo các hợp phần (*Hợp phần Compact do UBND thực hiện và bốn hợp phần Compact do các công ty thực hiện*).

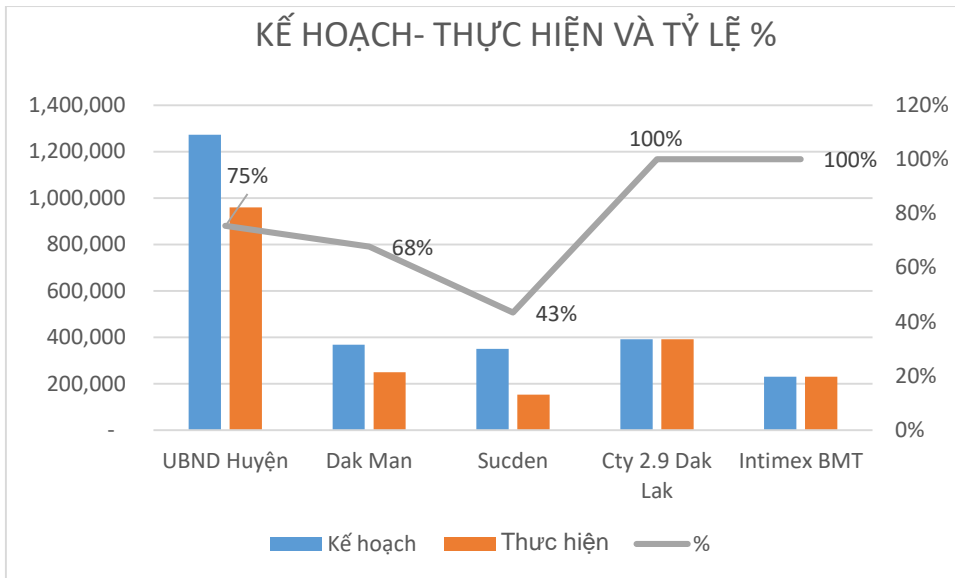

Bảng 4: Các chỉ số theo dự án hợp phần Compact năm 2022

4.1. Hợp phần Compact, Dự án Phát triển vùng nguyên liệu qui mô lớn CuMgar thông qua việc thúc đẩy quản lý hóa chất nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm và giảm phát thải Các bon trong sản xuất, do UBND huyện thực hiện.

No	Hoạt động	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Cấp huyện (Compact)					
I	Quản trị và điều phối				
1.1	Sự kiện, Hội thảo, họp	Cuộc	3	2	67%
	- Hội nghị khởi động Chương trình Compact	Cuộc		1	
	- Hội nghị Quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV an toàn, có trách nhiệm	Cuộc		1	
1.2	Chiến dịch truyền thông/các hoạt động truyền thông	Đợt	5	4	80%
	- In 17 bảng các bước lồng ghép Chương trình Compact tại cấp xã	Bảng		17	
	- Mở trang chuyên mục Compact trên cổng thông tin điện tử Huyện	Chuyên mục		1	
	- Truyền thông về bảo vệ cây xanh và môi trường trong trường học	Trường		2	
1.3	Truyền thông qua hình thức phát các bản tin trên hệ thống loa phát thanh tới các thôn/buôn (12 xã, thị trấn/200 thôn/buôn)	Lượt	3,500	3,500	
II	Bảo vệ tài nguyên				
2.1	Bảo vệ rừng				
	- Tăng diện tích rừng trồng (ha)	Ha	100	-	0%
	- Bảo vệ rừng	Ha	6,747	6,747	100%
	- Tăng cây trồng phân tán (tại khu dân cư, công sở, đường giao thông)	Cây	2,000	7,929	396%

2.2	Bảo tồn nước				
	Tập huấn về quản lý nước cho các HTX thủy nông	Người	30	30	100%
	Cải tạo, nâng cấp hồ đập thủy lợi	Công tình	2	2	100%
	Duy trì, vận hành khai thác công trình thủy lợi	Công tình	67	67	100%
III	Giám sát, đánh giá - Cấp huyện/Compact				
	Giám sát (thu thập dữ liệu)	Đợt	3	3	100%
	Xây dựng khung pháp lý về giám sát phát thải carbon	Vấn bản			
Cấp xã (Hợp phần Compact)					
I	Phương pháp tiếp cận cảnh quan				
1.1	Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp cận cảnh quan	Người	90	90	100%
1.2	Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân	Người			
II	Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước				
2.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Dinh dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ dại, quản lý hoá chất, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, quản lý nước	Người	3,900	3,900	100%
2.2	Hỗ trợ thành lập đội dịch vụ nông nghiệp (5 người/đội)	Đội	2	2	100%
2.3	Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ (máy cắt cỏ và bộ đồ bảo hộ)	Cái	5	5	100%
2.4	Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu và phân tích)	Mẫu	100	100	100%
2.5	Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình	Người	100	100	100%
2.6	Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín dụng/nguồn tài chính	Đề xuất			
III	Sản xuất bền vững				
3.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Kỹ thuật tái canh, quản lý sâu bệnh hại, kỹ thuật thu hái và chế biến sau thu hoạch, và an toàn lao động	Người			
3.2	Khảo sát và thiết kế ô kỹ thuật	Đợt	1		
3.3	Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí cây giống, vận chuyển)	Ha	300		
3.4	Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn trái), cây chắn gió, gồm (chi phí cây giống và vận chuyển)	Cây	12,000	36,580	305%
IV	Quản lý và giám sát đánh giá				
4.1	Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm	Mẫu	25	25	100%
4.2	Định kỳ thu thập dữ liệu	Lượt	3	3	100%

4.2. Hợp phần Compact, dự án do công ty Simexco thực hiện

No	Hoạt động	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Phương pháp tiếp cận cảnh quan				
1.1	Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp cận cảnh quan	Người	45	45	100%
1.2	Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân	Người	6,150	5,179	84%
II	Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước				
2.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Dinh dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ dại, quản lý hoá chất, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, quản lý nước	Người	6,150	5,179	84%
2.2	Hỗ trợ thành lập hai đội dịch vụ nông nghiệp (5 người/đội)	Đội	3	3	100%
2.3	Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ (máy cắt cỏ và bộ đồ bảo hộ)	Cái	3	3	100%
2.4	Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu và phân tích)	Mẫu	50	50	100%
2.5	Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình	Người	250	250	100%
2.6	Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín dụng/nguồn tài chính	Đề xuất			
III	Sản xuất bền vững				
3.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Kỹ thuật tái canh, quản lý sâu bệnh hại, kỹ thuật thu hái và chế biến sau thu hoạch, và an toàn lao động	Người	6,150	5,179	84%
3.2	Khảo sát số liệu	Đợt	2,956	2,956	100%
3.3	Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí cây giống, vận chuyển)	Ha	600	600	100%
3.4	Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn trái), cây chắn gió, gồm (chi phí cây giống và vận chuyển)	Cây	15,000	15,000	100%
IV	Quản lý và giám sát đánh giá				
4.1	Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm	Mẫu	20	20	100%
4.2	Định kỳ thu thập dữ liệu	Lượt	2	2	100%

4.3. Hợp phần Comact, dự án do công ty Intimex BMT thực hiện

No	Hoạt động	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Phương pháp tiếp cận cảnh quan				
1.1	Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp cận cảnh quan	Người	30	30	100%
1.2	Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân	Người	2,150	2,150	100%
II	Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước				
2.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Dinh dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ dại, quản lý hoá chất, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, quản lý nước	Người	2,150	2,150	100%
2.2	Hỗ trợ thành lập hai đội dịch vụ nông nghiệp (5 người/đội)	Đội	2	2	100%
2.3	Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ (máy cắt cỏ và bộ đồ bảo hộ)	Cái	2	2	100%
2.4	Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu và phân tích)	Mẫu	50	50	100%
2.5	Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình	Người	100	100	100%
2.6	Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín dụng/nguồn tài chính	Đề xuất			
III	Sản xuất bền vững				
3.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Kỹ thuật tái canh, quản lý sâu bệnh hại, kỹ thuật thu hái và chế biến sau thu hoạch, và an toàn lao động	Người	2,150	2,150	100%
3.2	Khảo sát và thiết kế ô kỹ thuật	Đợt	1	1	
3.3	Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí cây giống, vận chuyển)	Ha		15	
3.4	Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn trái), cây chắn gió, gồm (chi phí cây giống và vận chuyển)	Cây		1,500	
IV	Quản lý và giám sát đánh giá				
4.1	Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm	Mẫu	20	20	100%
4.2	Định kỳ thu thập dữ liệu	Lượt			

4.4. Hợp phần Comact, dự án do công ty Sucden Coffee thực hiện

No	Hoạt động	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Phương pháp tiếp cận cảnh quan				
1.1	Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp cận cảnh quan	Người	75	63	84%
1.2	Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân	Người	4,011	3,543	88%
II	Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước				
2.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Dinh dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ dại, quản lý hoá chất, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, quản lý nước	Người	4,011	3,543	88%
2.2	Hỗ trợ thành lập hai đội dịch vụ nông nghiệp (5 người/đội)	Đội	4	2	50%
2.3	Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ (máy cắt cỏ và bộ đồ bảo hộ)	Cái	24	10	42%
2.4	Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu và phân tích)	Mẫu	200	200	100%
2.5	Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình	Người	-	-	
2.6	Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín dụng/nguồn tài chính	Đề xuất	3	-	
III	Sản xuất bền vững				
3.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Kỹ thuật tái canh, quản lý sâu bệnh hại, kỹ thuật thu hái và chế biến sau thu hoạch, và an toàn lao động	Người	4,011	3,543	88%
3.2	Khảo sát và thiết kế ô kỹ thuật	Đợt	NA	-	
3.3	Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí cây giống, vận chuyển)	Ha	150	129	86%
3.4	Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn trái), cây chắn gió, gồm (chi phí cây giống và vận chuyển)	Cây	2,000	21,804	1090%
IV	Quản lý và giám sát đánh giá				
4.1	Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm	Mẫu	20	20	100%
4.2	Định kỳ thu thập dữ liệu	Lượt	2	-	0%

4.5. Hợp phần Comact, dự án do công ty Dak Man thực hiện

No	Hoạt động	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Phương pháp tiếp cận cảnh quan				
1.1	Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp cận cảnh quan	Người	60	-	0%
1.2	Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân	Người	1018	-	0%
II	Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước				
2.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Dinh dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ dại, quản lý hoá chất, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, quản lý nước	Người	3233	1,441	45%
2.2	Hỗ trợ thành lập hai đội dịch vụ nông nghiệp (5 người/đội)	Đội	3	-	0%
2.3	Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ (máy cắt cỏ và bộ đồ bảo hộ)	Cái	6	-	0%
2.4	Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu và phân tích)	Mẫu	217	12	6%
2.5	Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình	Người	500	-	0%
2.6	Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín dụng/nguồn tài chính	Đề xuất			
III	Sản xuất bền vững				
3.1	Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn: Kỹ thuật tái canh, quản lý sâu bệnh hại, kỹ thuật thu hái và chế biến sau thu hoạch, và an toàn lao động	Người	1,503	1,201	80%
3.2	Khảo sát và thiết kế ô kỹ thuật	Đợt	1	-	
3.3	Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí cây giống, vận chuyển)	Ha	190	24	13%
3.4	Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn trái), cây chắn gió, gồm (chi phí cây giống và vận chuyển)	Cây	2,800	9,336	333%
IV	Quản lý và giám sát đánh giá				
4.1	Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm	Mẫu	33	42	127%
4.2	Định kỳ thu thập dữ liệu	Lượt	2		0%

