

Số: /BC-BCĐ

Cư M'gar, ngày tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2023 Chương trình Sản xuất kết hợp với Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội huyện Cư M'gar

I. TỔNG QUAN

Chương trình sản xuất kết hợp với Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội huyện Cư M'gar, còn gọi là (Compact Cư M'gar) thực hiện giai đoạn 2021-2025, do IDH phát triển và hỗ trợ, đồng tài trợ công ty JDE cùng với các công ty thu mua cà phê, hồ tiêu, trái cây và chính quyền địa phương, với mục tiêu: (i) Thúc đẩy và hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững; Nâng cao chất lượng sản phẩm, và kết nối thị trường (ii) Bảo tồn nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; (iii) Tạo thu nhập và bình đẳng giới. Chương trình được thực hiện thông qua hợp tác công tư (PPP).

Chương trình được triển khai đồng bộ trên phạm vi 15 xã và 2 thị trấn, với quy mô: 37.726 ha cà phê, 4.800 ha hồ tiêu, 3.000 ha cây ăn quả các loại, và 11.740 ha rừng, (trong đó: 6,747 ha rừng tự nhiên và 212 ha rừng trồng). Chương trình hướng đến hình thành vùng nguyên liệu bền vững quy mô lớn huyện Cư M'gar (VSA) vào năm 2025, và là một phần trong mục tiêu tổng thể “Vùng nguyên liệu bền vững quy mô lớn tỉnh Đắk Lắk” do IDH hỗ trợ.

Chương trình Compact Cư M'gar, gồm 5 dự án hợp phần, trong đó công ty Simexco Daklak thực hiện 1; Công ty Intimex Buôn Ma Thuột thực hiện 1; Công ty Dakman thực hiện 1; Công ty Sucden Coffee thực hiện 1; Phòng NN&PTNT huyện thực hiện 1.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai Chương trình Compact Cư M'gar, giai đoạn 2021-2025, và cũng là năm thực hiện đánh giá giữa kỳ của Chương trình. Năm 2023 tiếp tục triển khai các hoạt động đã được các bên thống nhất và phân bổ cho từng năm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2023

3.1. Công tác chỉ đạo

Tổ thư ký Ban chỉ đạo đã phối hợp với Văn phòng UBND huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng ban/UBND các xã và các thành viên Ban chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch năm 2023.

3.2. Hoạt động tuyên truyền, truyền thông

Với sự hỗ trợ của tổ chức IDH, Tổ thư ký Ban chỉ đạo phối hợp với Phòng văn hóa thông tin, Đài phát thanh truyền hình tiếp tục duy trì phát các bản tin, viết bài

đưa tin các hoạt động thuộc Chương trình trên các kênh thông tin, gồm: Trang chuyên mục Compact trên cổng thông tin điện tử của huyện; Hệ thống loa phát thanh; Đài phát thanh truyền hình; Kênh Youtube; Lồng ghép trong các cuộc họp và trong các lớp tập huấn nông dân;

- Biên tập và thu âm bản tin số 05 về quy định chống phá rừng của Liên Minh Châu Âu, duy trì phát 4 bản tin, gồm: (i) *Bản tin 01* “cảnh báo tồn dư hóa chất cấm trong sản phẩm cà phê và hồ tiêu”; (ii) *Bản tin 02* "Bảo vệ nguồn tài nguyên để phát triển bền vững"; (iii) *Bản tin 03* “khuyến cáo người dân thu hái cà phê niên vụ 2022-2023 đảm bảo chất lượng”; (iv) *Bản tin 04* "Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp”, các bản tin này được phát qua hệ thống loa phát thanh tới các thôn/buôn trên địa bàn huyện và phát hàng ngày vào các khung giờ (buổi sáng và chiều tối), mỗi bản tin sẽ phát với thời gian từ 1-3 tháng/bản tin;

- Biên tập/viết 14 bản tin hoạt động thuộc Chương trình Compact, trong đó công ty Simexco Daklak viết 4 bản tin; Phòng NN&PTNT viết 2 bản tin; Phòng văn hóa thông tin huyện viết 3 bản tin; Công ty Intimex BMT viết 2 bản tin; Công ty Sucden Coffee viết 2 bản tin; Hạt kiểm lâm viết 1 bản tin;

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Chương trình Compact lồng ghép trong Lễ hội ẩm thực, mở gian hàng sản phẩm nông sản vùng Compact với sự tham gia của các công ty/HTX trong vùng Compact tại Lễ hội thu hút đông đảo bà con nông dân trên địa bàn tham gia cuộc thi và thăm quan gian hàng trong lễ hội.

3.4. Nâng cao năng lực sản xuất và hỗ trợ nông dân

- *Nâng cao năng lực sản xuất*: (i) Tập huấn cho 6.065 lượt nông dân, trong đó tỷ lệ (nam là 67%, nữ 33%) tham gia tập huấn với các chủ đề: Sản xuất bền vững/sản xuất có trách nhiệm, Bảo tồn đất, nước; Kỹ thuật tái canh, cây trồng xen; Quản lý cỏ dại/quản lý thảm phủ; Quản lý và sử dụng hóa chất có trách nhiệm; Chế biến sau thu hoạch, chế biến cà phê chất lượng cao/cà phê đặc sản;


- *Hỗ trợ sản xuất bền vững*: Hỗ trợ một phần cây giống và người dân tự tái canh khoảng 650 ha, và 15.000 cây trồng xen các loại; Hỗ trợ phân tích 150 mẫu đất, và 20 mẫu tồn dư hoạt chất Glyphosate; Hỗ trợ mô hình ủ phân hữu cơ.

3.5. Hoạt động khác


Tổ chức tiếp đoàn công tác tổ chức IDH đến thăm và trao đổi về Chương trình Compact huyện Cư M'gar; Tiếp đoàn Đại sứ các nước Bắc Âu tại Việt Nam thăm dự án hợp phần Compact Cư M'gar do công ty Simexco Đắk Lắk thực hiện.

3.6. Tình hình giải ngân sáu tháng đầu năm 2023


Bảng 1: Giải ngân sáu tháng đầu năm 2023 Chương trình Compact Cư M'gar.

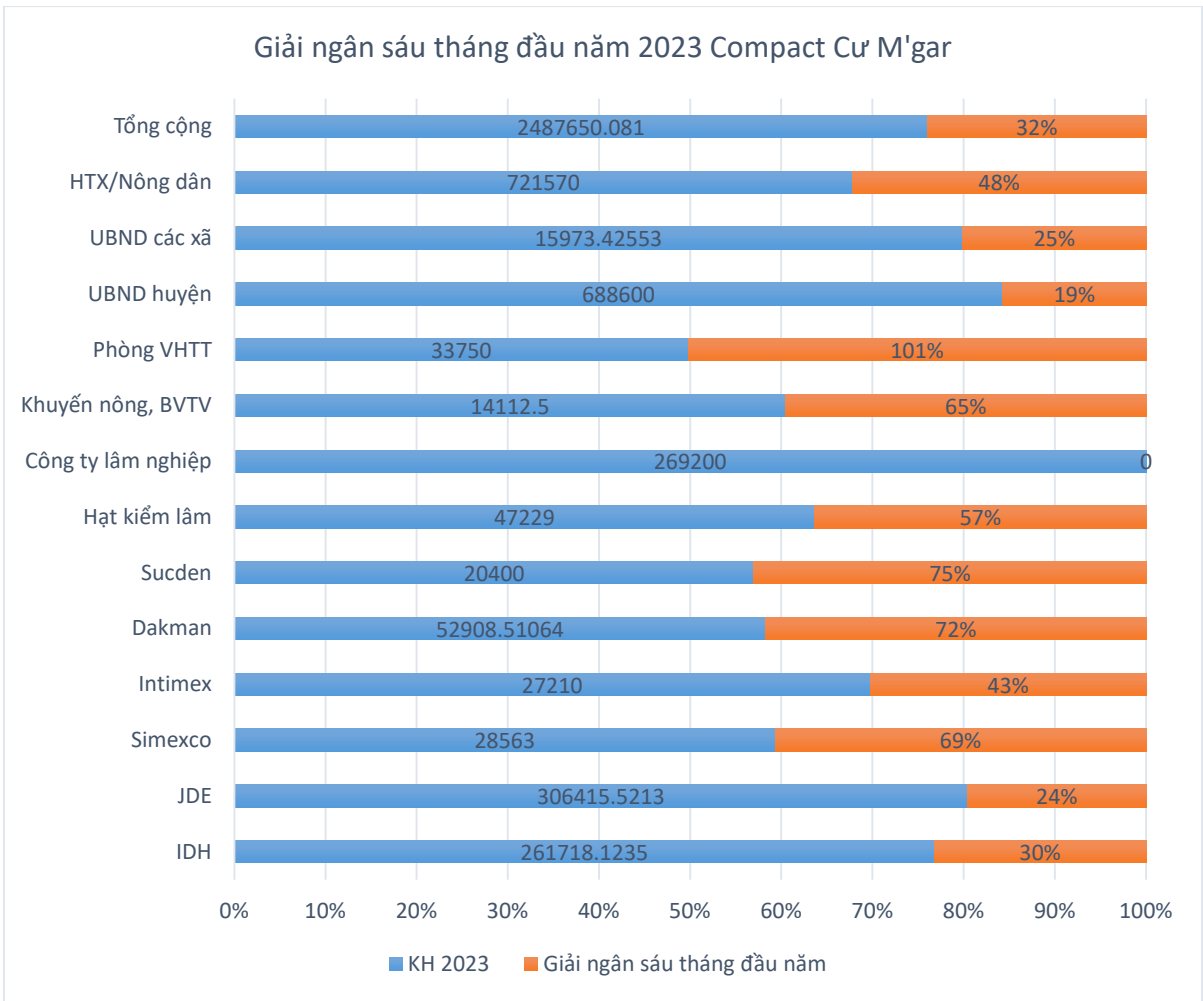


Bảng 2: Giải ngân sáu tháng đầu năm 2023, dự án hợp phần do Phòng NN&PTNT thực hiện, tại các xã: Ea H’ding; Ea M’nang; Ea Tul và thị trấn Quảng Phú.

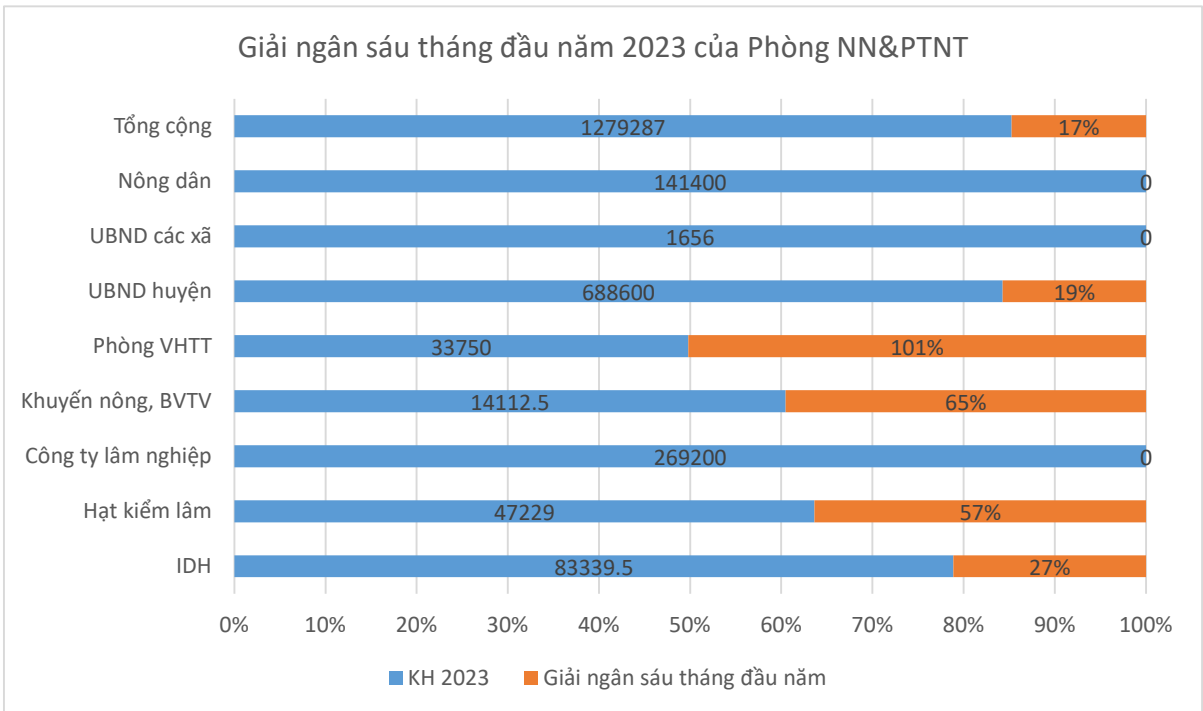


Bảng 3: Giải ngân sáu tháng đầu năm 2023, dự án hợp phần do công ty Simexco Daklak thực hiện, tại các xã: Cư Suê; Ea Kpam; Ea Drong; thị trấn Ea Pôk và Côur Đăng.

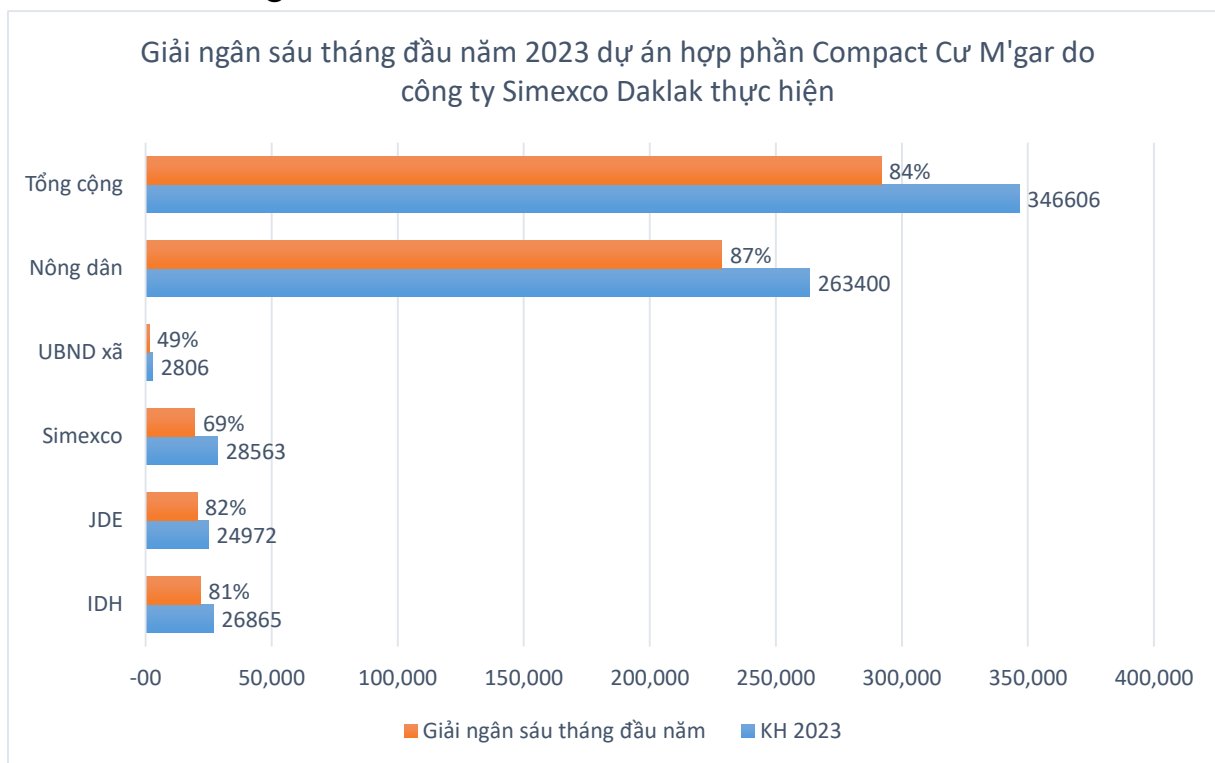


Bảng 4: Giải ngân sáu tháng đầu năm 2023, dự án hợp phần do công ty Intimex Buôn Ma Thuột thực hiện, tại các xã: Ea Kueh và Quảng Tiến.

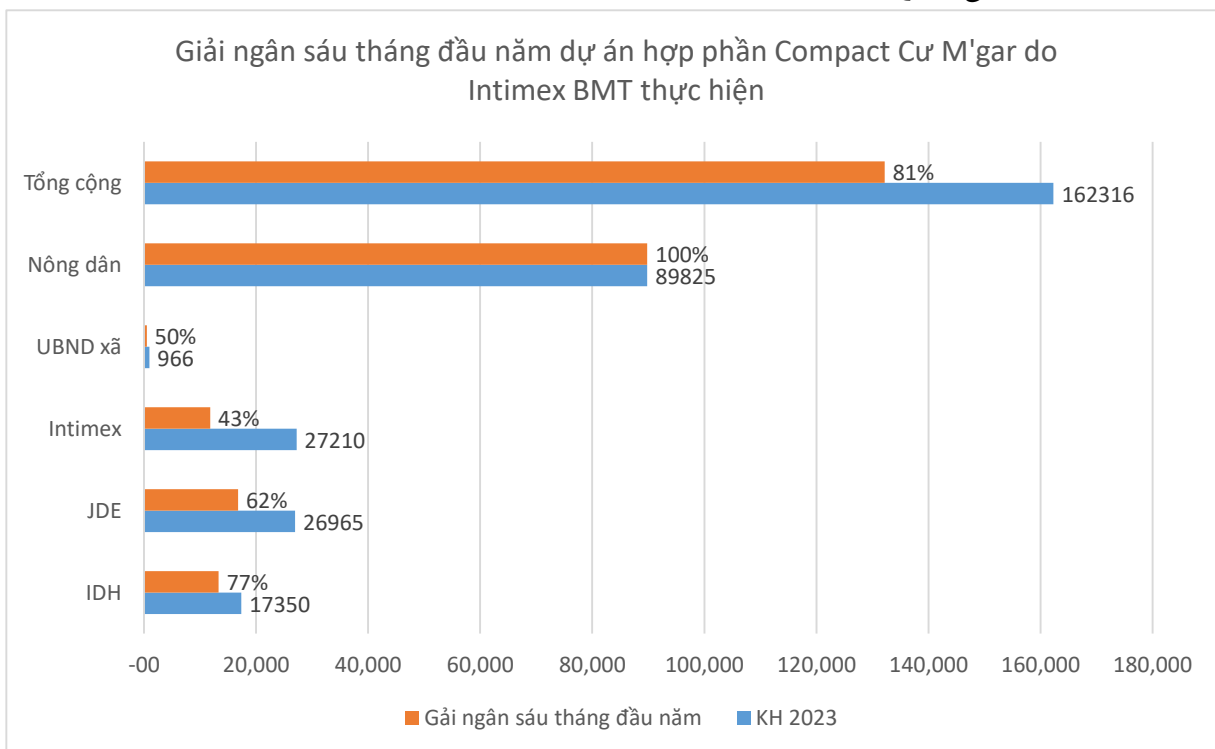

Bảng 5: Giải ngân sáu tháng đầu năm 2023, dự án hợp phần do công ty Dakman thực hiện, tại các xã: Ea Kiết; Ea Tar và Cư Dlie Mnông.

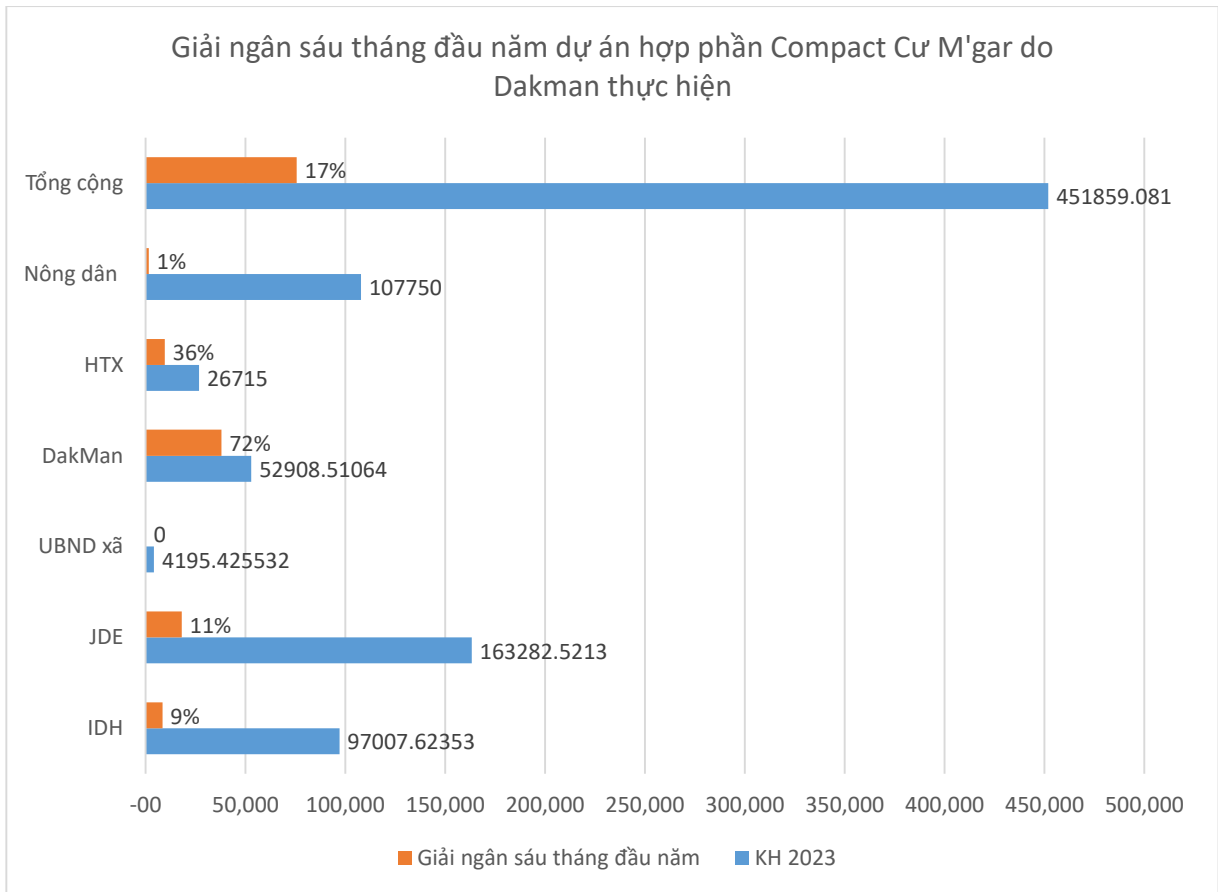

Bảng 6: Giải ngân sáu tháng đầu năm 2023, dự án hợp phần do công ty Sucden Coffee thực hiện, tại các xã: Ea M'roh; Quảng Hiệp và Cư M'gar.

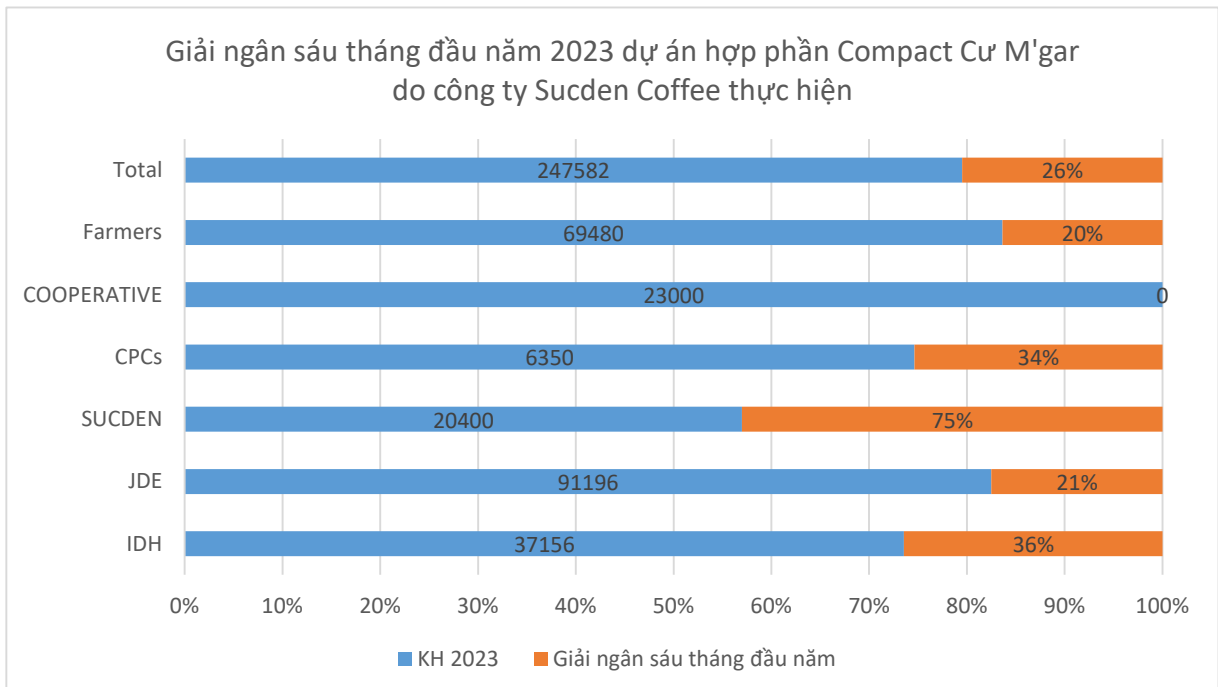

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2023

4.1. Đánh giá chung

Tổng thể tình hình triển khai các hoạt động và giải ngân sáu tháng đầu năm 2023 Chương trình Compact Cư M'gar, đạt 32% so với kế hoạch năm; Các hoạt

động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% so với kế hoạch, gồm: Phòng văn hóa thông tin 101%; Hạt kiểm lâm 57%; Khuyến nông/BVTV đạt 65%; Simexco 69%; Dakman 72%; Sucden coffee 75%. Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân dưới 50%, gồm: Nguồn từ nông dân 48%; UBND huyện/xã 19% và 25%; Intimex 43%; IDH 30%; và JDE 24%.

4.2. Đánh giá theo dự án hợp phần

- Dự án hợp phần Compact do Phòng NN&PTNT thực hiện: Tình hình triển khai các hoạt động và giải ngân sáu tháng đầu năm 2023, đạt 17% so với kế hoạch năm; Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% so với kế hoạch, gồm: Văn hóa thông tin đạt 101%; Hạt kiểm lâm đạt 57%; Khuyến nông/BVTV đạt 65%. Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân dưới 50%, gồm: Nguồn từ nông dân 0%; UBND huyện 19%; Công ty lâm nghiệp 0%; IDH 27%.

- Dự án hợp phần Compact do công ty Simexco Daklak thực hiện: Tình hình triển khai các hoạt động và giải ngân sáu tháng đầu năm 2023 đạt 84% so với kế hoạch năm; Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% so với kế hoạch, gồm: Nguồn từ nông dân/HTX đạt 87% ; JDE đạt 82%; IDH đạt 81%; Simexco 69%. Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân dưới 50%, gồm: UBND cá xã 49%.

- Dự án hợp phần Compact do công ty Intimex Buôn Ma Thuật thực hiện: Tình hình triển khai các hoạt động và giải ngân sáu tháng đầu năm 2023 đạt 81% so với kế hoạch năm; Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% so với kế hoạch, gồm: Nguồn từ nông dân/HTX đạt 100%; JDE đạt 62%; IDH đạt 77%; UBND các xã 50%. Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân dưới 50%, gồm: Intimex BMT 43%.

- Dự án hợp phần Compact do công ty Dakman thực hiện: Tình hình triển khai các hoạt động và giải ngân sáu tháng đầu năm 2023 đạt 17% so với kế hoạch năm; Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% so với kế hoạch, gồm: Nguồn từ Dakman đạt 72%. Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân dưới 50%, gồm: Nguồn từ nông dân đạt 1%; HTX đạt 36%; UBND các xã 0%; IDH 9% và JDE 11%.

- Dự án hợp phần Compact do công ty Sucden Coffee thực hiện: Tình hình triển khai các hoạt động và giải ngân sáu tháng đầu năm 2023 đạt 26% so với kế hoạch năm; Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% so với kế hoạch, gồm: Nguồn từ Sucden Cofee đạt 75%. Các hoạt động/dòng ngân sách/nguồn lồng ghép đạt tỷ lệ giải ngân dưới 50%, gồm: Nguồn từ nông dân đạt 20%; HTX đạt 0%; UBND các xã 34%; IDH 36% và JDE 21%.

4.3. Nguyên nhân

Từ bảng tổng hợp kết quả các hoạt động và tỷ lệ giải ngân sáu tháng đầu năm 2023 thuộc Chương trình Compact và các dự án hợp phần, chỉ ra:

- *Dự án hợp phần do công ty Simexco Daklak và công ty Intimex BMT thực hiện* đạt mức giải ngân cao hơn so với dự án hợp phần do Phòng NN&PTNT;

công ty Sucden Coffee; Công ty Dakman huyện thực hiện, do: Công ty Simexco Daklak và Công ty Intimex BMT có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc và bố trí đủ lực lượng cán bộ nông nghiệp trực tiếp/chủ động triển khai các hoạt động, và do vậy kết quả các hoạt động đạt được và mức giải ngân cao, (Simexco là 84%, trong đó nguồn IDH là 81% và nguồn từ JDE là 82%; Intimex đạt 81%, trong đó nguồn IDH đạt 77% và nguồn từ JDE là 62%).

- *Dự án hợp phần do Phòng NN&PTNT thực hiện* đạt mức giải ngân còn thấp, do: Phòng NN&PTNT không có cán bộ chuyên trách mà chủ yếu kiêm nhiệm, do vậy ít nhiều có ảnh hưởng/tác động tới các hoạt động, cụ thể là tỷ lệ giải ngân sáu tháng đầu năm đạt 17 %, nguồn từ IDH đạt 27%. Ngoài ra, một lý do mà tỷ lệ giải ngân sáu tháng đầu năm dự án hợp phần do Phòng NN&PTNT đạt thấp, vì liên quan đến một số hoạt động triển khai qua đơn vị tư vấn theo hợp đồng, (VD: Hợp đồng tập huấn theo gói; Hợp đồng cung cấp cây giống...), các hoạt động này được thực hiện kéo dài hàng quý, và phải được nghiệm thu thì mới đưa vào báo cáo.

- *Dự án hợp phần do công ty Sucden coffee thực hiện* đạt mức giải ngân thấp 26%, do có sự thay đổi nhân sự thời gian qua (quý 2/2023), do vậy đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các hoạt động và giải ngân trong quý 2 cũng như sáu tháng đầu năm 2023 của công ty. Nguồn từ IDH đạt 36% và nguồn từ JDE đạt 21%).

- *Dự án hợp phần do công ty Dakman thực hiện* đạt mức giải ngân thấp 17% so với kế hoạch năm, (trong đó nguồn từ IDH đạt 9% và nguồn từ JDE đạt 11%) do công ty chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và bố trí đủ nhân sự cho dự án hợp phần, từ đó dẫn tới kết quả các hoạt động và mức giải ngân của Dakman là rất thấp, thấp nhất trong các dự án hợp phần. Ngoài ra Dakman cũng là đơn vị chưa tham gia viết bài đưa tin hoạt động đăng tải trên trang Compact huyện Cư M'gar.

4.4. Kiến nghị

- Để đạt được 100% kế hoạch năm 2023, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cần tập trung và nỗ lực hơn nữa, phát huy kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm, tăng cường tuyên truyền, truyền thông tới cán bộ quản lý các cấp, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, hiểu về sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm; Thành viên Ban chỉ đạo truy cập vào trang chuyên mục Compact tìm hiểu, cập nhật thông tin về Chương trình, đồng thời giới thiệu tới thành viên khác, đặc biệt các thành viên là UBND cấp xã sẽ giới thiệu tới người dân trên địa bàn về trang chuyên mục Compact, để người dân biết và truy cập tìm hiểu thông tin cũng như tìm đọc các tài liệu về sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm từ trang chuyên mục Compact;

- Phòng NN&PTNT, Phòng Văn hóa Thông tin, bộ phận quản trị công thông tin điện tử và các công ty tham gia Chương trình cần duy trì viết bài/đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động thuộc Chương trình đăng tải trên trang Chuyên mục Compact.

V. KẾT LUẬN

Báo cáo này được tổng hợp từ 5 (năm) dự án hợp phần Compact, (trong đó công ty Simexco Đắk Lắk thực hiện tại các xã: Cư Suê; Ea Kpam; Ea Drong; thị trấn Ea Pók và Cư Đăng; Công ty Intimex BMT thực hiện tại các xã: Ea Kueh và Quảng Tiến; Công ty Dakman thực hiện tại các xã: Ea Kiết; Ea Tar và Cư Dlie Mnông; Công ty Sucden coffee thực hiện tại các xã: Ea M'roh; Quảng Hiệp và Cư M'gar; Phòng NN&PTNT thực hiện tại các xã: Ea H'đing; Ea M'ngang; Ea Tul và thị trấn Quảng Phú).

Nơi nhận:

- Thành viên Theo QĐ số 863/QĐ-BCĐ, ngày 28/02/2022;
- CT các Phó CT UBND;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Tổ chức IDH;
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Công Văn

Phụ lục 1: Tiến độ triển khai các hoạt động sáu tháng đầu năm 2023

1.1. Dự án hợp phần do Phòng NN&PTNT huyện thực hiện

No	Hoạt động	ĐVT	KH 2023	Thực hiện sáu tháng	Tỷ lệ %
1	Tổ chức sự kiện/Hội nghị	Sự kiện	4	1	25%
2	Truyền thông	Tháng	6	6	100%
3	Trồng rừng	Ha	100	-	0%
4	Trồng cây phân tán	Cây	2,000	-	0%
5	Nâng cấp hồ đập thủy lợi	CT	1	2	200%
6	Duy trì vận hành công trình thủy lợi	CT	5	5	100%
7	Thu thập dữ liệu (M&E)	Đợt	2	1	50%
8	Hỗ trợ thành lập đội dịch vụ nông nghiệp	Đội	2	-	0%
9	Hỗ trợ mô hình quản lý cỏ dại	Mô hình	8	-	0%
10	Hỗ trợ một phần cây giống trồng xen	Cây	12,000	-	0%
11	Hỗ trợ một phần cây giống tái canh	Ha	300	-	0%
12	Tập huấn nông dân về sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm	Lượt	3,600	520	14%
13	Phân tích tồn dư Glyphosate/hoạt chất cấm	Mẫu	25	-	0%

1.2. Dự án hợp phần do Simexco thực hiện

No	Hoạt động	ĐVT	KH 2023	Thực hiện sáu tháng	Tỷ lệ %
1	Phân tích đất	Mẫu	25	-	0%
2	Tập huấn nông dân về sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm	Nông dân	6,100	4,400	72%
3	Thăm quan học tập qua mô hình thành công	Nông dân	250	-	0%
4	Hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý cỏ dại	Mô hình	2	-	0%
5	Hỗ trợ một phần cây giống tái canh	Ha	600	600	100%
6	Hỗ trợ một phần cây trồng xen	Cây	15,000	-	0%
7	Phân tích tồn dư Glyphosate/chất cấm	Mẫu	20	20	100%

1.3. Dự án hợp phần do Intimex thực hiện

No	Hoạt động	ĐVT	KH 2023	Thực hiện sáu tháng	Tỷ lệ %
1	Phân tích đất	Mẫu	150	150	100%
2	Tập huấn nông dân về sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm	Nông dân	2,050	1,025	50%
3	Hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý cỏ dại	Mô hình	3	-	0%

4	Hỗ trợ một phần cây giống tái canh	Ha	200	200	100%
5	Hỗ trợ một phần cây trồng xen	Cây	15,000	15,000	100%
6	Phân tích tồn dư Glyphosate/chất cấm	Mẫu	20	-	0%

1.4. Dự án hợp phần do Dakman thực hiện

No	Hoạt động	ĐVT	KH 2023	Thực hiện sáu tháng	Tỷ lệ %
1	Tập huấn tiểu giảng viên	Người	120	120	100%
2	Tập huấn nông dân về sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm	Nông dân	9,312	-	0%
3	Hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý cỏ dại	Mô hình	6	-	0%
4	Tham quan học tập mô hình thành công	Nông dân	1,000	-	0%
5	Hỗ trợ mô hình tưới tiết kiệm	Mô hình	3	-	0%
6	Hỗ trợ thùng chứa thu gom rác thải	Thùng	60	-	0%
7	In tờ rơi sản xuất bền vững	Tờ	3,000	-	0%
8	Hỗ trợ một phần cây giống tái canh	Ha	312	-	0%
9	Hỗ trợ một phần cây trồng xen	Cây	17,320	17,365	15%

1.5. Dự án hợp phần do Sucden Coffee thực hiện

No	Hoạt động	ĐVT	KH 2023	Thực hiện sáu tháng	Tỷ lệ %
1	Phân tích đất	Mẫu	250	-	0%
2	Tập huấn nông dân về sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm	Nông dân	-	-	0%
3	Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho đội dịch vụ nông nghiệp	Đội	6	-	0%
4	Hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý thảm phủ	Ha	100	-	0%
5	Hỗ trợ một phần cây giống tái canh	Ha	150	50	33%
6	Hỗ trợ một phần cây trồng xen	Ha	5	5	100%
7	Hỗ trợ mô hình ủ phân hữu cơ	ha	110	10	9%
8	Mô hình quản lý IPM	Ha	110	-	0%
9	Hỗ trợ nạo vét ao hồ nhỏ	Cái	2	-	0%
10	Mô hình quản lý bao bì thuốc BTVT	Ha	150	-	0%
11	Phân tích tồn dư Glyphosate/chất cấm	Mẫu	40	-	0%
12	Pano truyền thông	Pano	9	-	0%
